2024年3月14·15日 行 政 報 告 資 料 環境資源部循環型施設整備課 環境資源部循環型施設管理課

## 新たなごみの資源化施設について

新たなごみの資源化施設について、2023年12月の行政報告以降の進捗状況等 を報告します。

## 1 資源ごみ処理施設(ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等)

資源ごみ処理施設整備は、昨年5月に改定した町田市資源循環型施設整備基本計画に基づき進めています。

#### (1) 相原地区資源ごみ処理施設について

施設用地については、2023年度内の取得完了を目標に関係者との調整を進めています。これまでに対象案件7件のうち4件について契約を結びました。

施設整備については、工事発注に向けた仕様書案の作成を行っています。有識者 1名、関係6課(職員15名)で構成する検討会を設置し、設備等の検討を行うと ともに、市民利用スペースの設えについて、当該地区に所在する町内会、自治会等 の代表で構成する相原地区資源ごみ処理施設連絡会のご意見を踏まえながら作成 作業を行っています。

#### (2) 上小山田地区資源ごみ処理施設について

忠生579号線の道路整備が現道拡幅に変更となったことに伴い、整備される道路から施設へのアクセス道路が必要となることから、土地の高低差、造成規模などを考慮した施設計画位置の再検討を行っています。現在、施設計画位置周辺の町田市が保有している土地周辺の土地について、関係者の意向調査を行っています。



【上小山田地区資源ごみ処理施設建設地検討範囲】

今後も地域のご理解を得ながら整備事業を進めます。

# 2 町田市バイオエネルギーセンター(ごみ焼却施設、バイオガス化施設、 不燃粗大ごみ処理施設)

#### (1) 工事の進捗状況

旧清掃工場の杭引き抜き工事が完了し、現在はストックヤード棟の造成及び建築工事を進めています。今後は外構工事として、ごみ収集車等の庁用車用駐車場と緑の広場の整備も行っていきます。

工事にあたっては、引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めます。

また、事業者から工事請負契約書約款第 42 条『賃金または物価の変動に基づく施設整備費の変更』に基づくインフレスライド条項に関する協議の申し入れがありました。内容について精査し、適切に対応してまいります。

#### 【熱回収施設等の整備スケジュール】

年		2023	2024									
月		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m + - =	杭引抜											
解体工事	付属建物等撤去											供
71	/=											用開
ストックヤード棟												始
外構工事	外構											

↑ 9/30 工事完了





造成状況

(トックヤード建築工事状況(杭打ち)

## 【熱回収施設等の整備スケジュール】(全体)

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
設計									
第1期工事	旧管理	棟・旧花の 造成		事					
第2期工事			工場		事・プラン 東建築工事		200 T 4		
						施設稼	)22年1,	月~ 運営開始	
第3期工事						B	現存工場棟	解体工事	
第4期工事						ストッ	クヤード	東・外構コ	事

## 3 町田市バイオエネルギーセンター運営協議会について

町田市バイオエネルギーセンターでは、施設運営状況を近隣15町内会・自治会代表の皆様に、施設運営の報告及び協議いただく場として、運営協議会を設置しています。2月9日に運営協議会を開催しましたので、その概要を報告します。


## (1) 第6回運営協議会(2024年2月9日開催)

# <主な議題とご意見等>

議題	内容	ご意見等
11 月 4 日の	バイオガス化施設で発生	・リチウムイオン電池について、指定
火災につい	した火災の概要と影響、今	収集袋に注意事項を明示したり、
て	後の対応	小型家電の出しやすさ検討したり
		するなど対応を進めて欲しい。
		・町内会・自治会と市が共同し、一歩
		進んだ啓発活動が必要ではない
		か。
		・市民の出したごみが原因で火災が
		発生していることを、もっと市民
		に知って欲しい。
運転状況報	各月のごみ処理計画量と	・ご意見はありませんでした。
告	処理実績の報告	
	(参考:図表1・2)	
	環境保全協定に基づく排	・ご意見はありませんでした。
	ガス・臭気の各種測定結果	


防災訓練の	町田市バイオエネルギー	・能登半島地震があったが、バイオ
実施報告	センターで実施した防災	エネルギーセンターの耐震性はど
	訓練の報告	うか。→震度6強でも機能を維持
		できる施設になっている。
その他	熱回収施設等整備事業の	・熱回収施設等整備事業の現在工事
	進捗状況の報告	中の敷地全体はどのようになる予
		定か。→緑の広場とストックヤー
		ドを整備していきます。

#### (図表1)

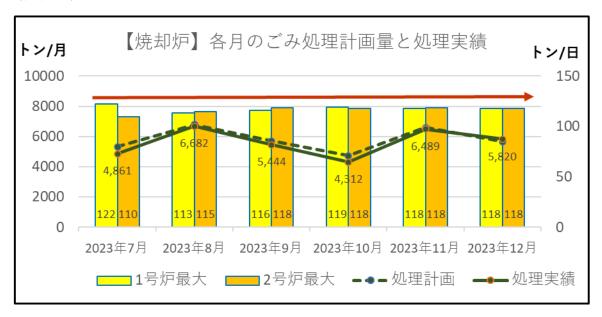

※処理実績が赤線の定格能力を下回っていることを示しています。

(図表2)

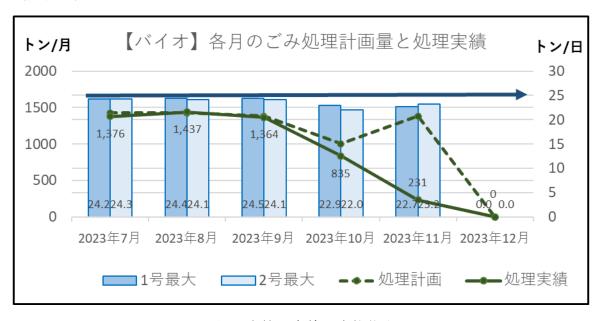

※処理実績が青線の定格能力を下回っていることを示しています。
