

新たなごみの資源化施設について

新たなごみの資源化施設について、2024年3月の行政報告以降の進捗状況等を報告します。

1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設の整備は、昨年5月に改定した町田市資源循環型施設整備基本計画に基づき進めています。

（1）相原地区資源ごみ処理施設について

施設用地の早期の取得完了を目指し関係者との調整を進めています。

7月24日に相原地区資源ごみ処理施設連絡会を開催し、事業の進捗状況等を報告する予定です。

（2）上小山田地区資源ごみ処理施設について


忠生579号線の道路整備が現道拡幅を基本とする方針に変更となったことに伴い、施設の計画位置の再検討を行っています。

本検討にあたっては、検討位置周辺の団体等に説明を行いました。

今後は、検討位置に施設整備する場合の課題等の調査検討を行う予定です。

また、6月28日に上小山田地区資源循環型施設連絡会を開催し、事業の進捗状況等を報告する予定です。

今後も地域のご理解を得ながら整備事業を進めます。

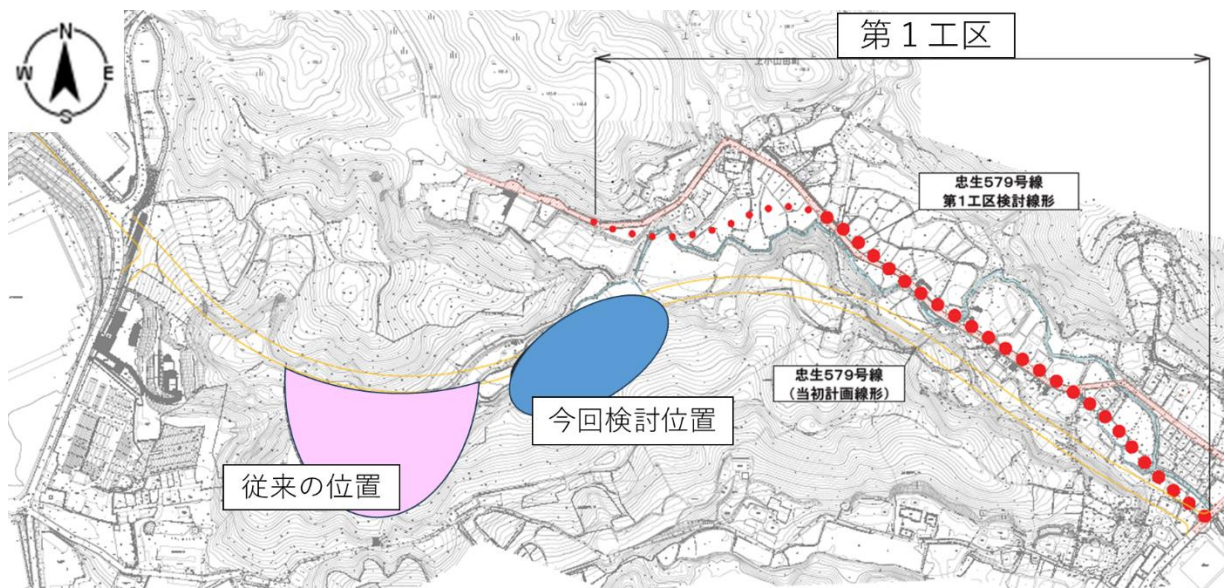

【上小山田地区資源ごみ処理施設検討位置】

2 町田市バイオエネルギーセンター（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）


（１）工事の進捗状況

ストックヤード棟の建築工事および外構工事を進めています。今後は、ごみ収集車等の庁用車用駐車場整備や草地・緑地の整備を行い9月で工事が完了する予定です。工事に当たっては、引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めます。

【熱回収施設等の整備スケジュール】

年		2023	2024									
月		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
解体工事	杭引抜											供 用 開 始
	付属建物等撤去											
ストックヤード棟 外構工事	造成											
	建築											
	外構											

↑
9/30 工事完了

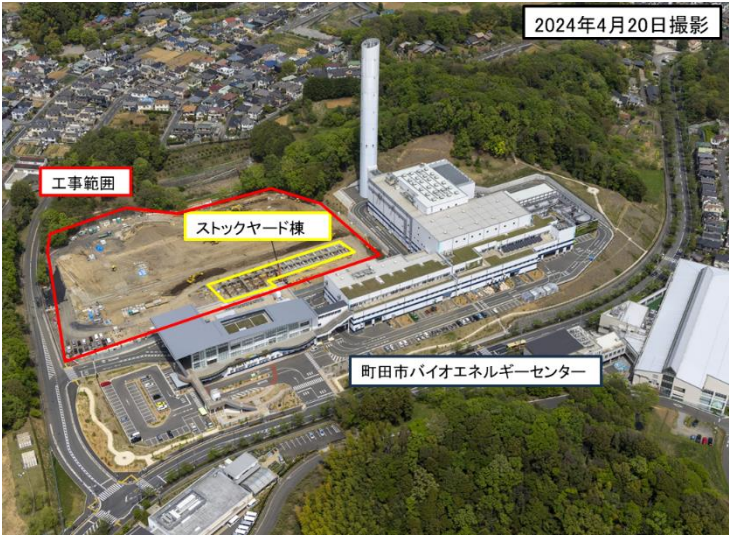

ストックヤード建築工事状況
（基礎躯体工事）



ストックヤード建築工事状況
（コンクリート打設）

【工事状況写真】

【熱回収施設等の整備スケジュール】（全体）

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								現在	
設 計									
第 1 期工事		旧管理棟・旧花の家解体工事 造成工事							
第 2 期工事			工場棟建築工事・プラント工事 新管理棟建築工事						
							2022年1月～ 施設稼働	運営開始	
第 3 期工事							既存工場棟解体工事		
第 4 期工事						ストックヤード棟・外構工事			

