

中学校給食センター整備事業について

町田市では、成長期の中学生全員にできる限り早期に温かい給食を提供するため、給食センター方式による全員給食実施に向けた取組を進めています。堺エリアでは9月3日にゆくのき学園の給食室から配送する形で全員給食を開始しました。また、現在建設中である、3つのエリアの中学校給食センター整備工事の進捗などを報告します。

1 各エリアの中学校給食センター整備工事


(1) 町田忠生小山エリア

旧忠生第六小学校の西側にて工事を進めています。2024年9月2日時点で内装の壁を張ったり、床を作る工事を行っています。2025年1月に工事完了予定です。

8月10日（土）に木曽山崎コミュニティーセンターで市民交流エリアの活用策を話し合うワークショップを事業者と共催し、様々な活用のアイデアが集まりました。



完成イメージ

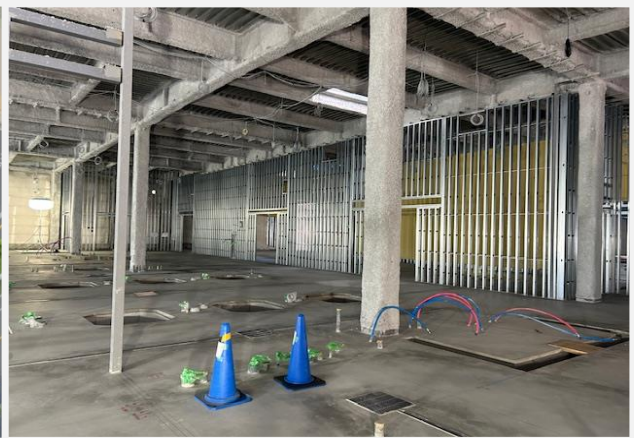

9月2日の建設地（内部）

<主なスケジュール>

2024年度							2025年度	
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
外装				工事完了	開業準備		開業	
内装								
外構								

（２）鶴川エリア

金井スポーツ広場の北側にて工事を進めています。２０２４年９月２日時点で外装が完了し、足場の解体をこれから行うとともに、今後は内装工事に入ります。２０２４年１１月に工事完了予定です。

２０２４年５月から鶴川エリアの中学校の生徒を対象に給食や食に関するアート作品を募集し、２０２４年７月から工事現場の仮囲いに展示しています。



完成イメージ



８月３０日の建設地



仮囲いアートの様子

2024年度					
9月	10月	11月	12月	1月	2月
外装		工事完了	開業準備	開業	
内装					
外構					

＜主なスケジュール＞

（３）南エリア

東光寺公園及び調整池にて工事を進めています。２０２４年９月２日時点で基礎となる鉄筋工事が終わったので、コンクリートを流し込んで固められるように型枠を設置しています。２０２５年６月に工事完了予定でしたが、天候不順等で工期が１か月延びました。しかし、検査期間と開業準備期間を短縮することで、開業時期の変更がないように調整しています。南エリアについてもワークショップの開催を予定しています。



完成イメージ



9月2日の建設地

<主なスケジュール>

2024年度							2025年度						
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
基礎配筋	スラブ配筋	スラブ配筋	二次埋戻	鉄骨建方	床下配管	外装					工事完了	開業準備	開業
						内装							
							外構						

(4) 堺エリア

2024年7月13日からゆくのき学園給食室の改修工事に着手し、厨房機器の増設などの整備を行いました。8月26日から給食室にて給食提供準備を行い、9月3日から給食提供を開始しました。



配送用トラックとコンテナ



9月3日給食の様子（堺中学校）

2 事業スケジュール

- 2024年度3学期 【鶴川エリア】全員給食開始
- 2025年度1学期 【町田忠生小山エリア】全員給食開始
- 2025年度2学期 【南エリア】全員給食開始

以上
