

新たなごみの資源化施設について

新たなごみの資源化施設について、2024年6月の行政報告以降の進捗状況等を報告します。

1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設の整備は、2023年5月に改定した町田市資源循環型施設整備基本計画に基づき進めています。

（1）相原地区資源ごみ処理施設について

施設用地の早期の取得完了を目指し関係者との協議を進めています。

7月24日に開催を予定していた相原地区資源ごみ処理施設連絡会は、委員の交代があり開催時期等を調整中です。

（2）上小山田地区資源ごみ処理施設について

6月28日に上小山田地区資源循環型施設連絡会を、7月27日に上小山田町内会において説明会を開催し、忠生579号線の道路整備が現道拡幅を基本とする方針に変更となったことに伴い、施設の計画位置について再検討を行うこと等を説明しました。

今後も地域のご理解を得ながら整備事業を進めます。

2 町田市バイオエネルギーセンター（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）


（1）工事の進捗状況

ストックヤード棟の建築工事およびごみ収集車等の庁用車用駐車場整備や草地・緑地の整備が9月末で約9年間にわたる整備工事が完了します。これにより、ストックヤード棟での資源化物の保管スペースが確保できるようになります。また、収集車や庁用車を一か所で管理できるようになります。

引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めます。

【熱回収施設等の整備スケジュール】

年		2023	2024									
月		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
解体工事	杭引抜											
	付属建物等撤去											
ストックヤード棟 外構工事	造成											
	建築											9/30
	外構											完了

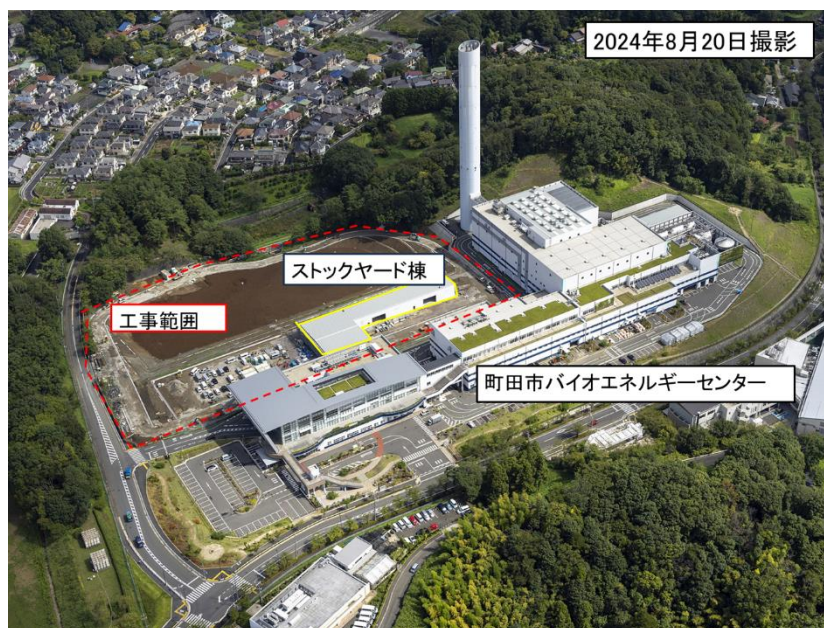

航空写真



ストックヤード棟建築工事状況
【工事状況写真】

【熱回収施設等の整備スケジュール】（全体）

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
									現在
設 計									
第 1 期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事	造成工事							
第 2 期工事				工場棟建築工事・プラント工事 新管理棟建築工事					
							2022 年 1 月～ 施設稼働	運営開始	
第 3 期工事							既存工場棟解体工事		
第 4 期工事							ストックヤード棟・外構工事		



3 町田市バイオエネルギーセンター運営協議会について

町田市バイオエネルギーセンターでは、施設運営状況を近隣15町内会・自治会代表の皆様へ、施設運営の報告及び協議いただく場として、運営協議会を設置しています。8月21日に第7回運営協議会を開催しましたので、その概要を報告します。

(1) 第7回運営協議会（2024年8月21日開催）

<主な議題とご意見等>

番号	議題	内容	ご意見等
1	運転状況報告	・各月のごみ処理計画量と処理実績の報告 ・多摩ニュータウン環境組合からのごみの受入れ（町田市域分）について	・多摩ニュータウン環境組合及び構成市間のごみの受入れ金額に施設の建設費は含まれているのか。 →含まれていません。
		環境保全協定に基づく排ガス・臭気の各種測定結果	・バイオガス発電機の排ガスは火災があったから測定できていないのか。 →停止中のため、測定できません。
2	バイオガス化施設の復旧工事	バイオガス化施設前処理設備の復旧工事の進捗報告	・これだけの被害があったのだから（ごみの分別に）協力すべきだと市民に周知してほしい。 ・バイオガス化施設の火災の再発防止策はどのようなものを検討されているか。 →消火設備や火災検知システムの増強を検討しています。
3	施設運営に関するご意見受付フロー（案）	休日・夜間に、緊急対応を要する施設運営に関するご意見受付方法（案）を説明	・対応主体は市と運営事業者とどちらという取り決めになっているのか。 →休日・夜間でも対応できるようにまず運営事業者が対応し市に報告されます。
4	合同消防訓練の実施報告	町田市バイオエネルギーセンターで実施した工場棟・管理棟合同消防訓練の報告	・今回の訓練のほかに火元と想定される場所はどこか？ →不燃粗大ごみ処理施設の「高速回転破砕機」にリチウムイオン電池が混入すると発火するおそれがあります。

<各月のごみ処理計画量と処理実績の報告>

