2 0 2 5 年 3 月 6 日・7 日行 政 報 告 資 料都市づくり部地区街づくり課


鶴川駅周辺再整備事業の進捗状況について

1 趣旨・背景

2016年に策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」の実現を図るため、北口 交通広場整備事業、南北自由通路整備・駅改良事業、鶴川駅南土地区画整理事業 及び南口アクセス道路整備事業等を進めており、各事業の進捗状況について報告 します。

2 各事業の進捗状況について

- ① 「北口交通広場整備事業」は、旧交通広場の撤去工事が完了いたしました。
- ② 「南北自由通路整備・駅改良事業」は、駅北口のデッキ築造や、自由通路及び駅舎の基礎等工事を行っております。
- ③ 「鶴川駅南土地区画整理事業」は、雨水調整池の整備工事に着手しました。 また、建物等移転を順次進めております。
- ④ 「南口アクセス道路整備事業」は、安全施設設置などの整備工事に着手しま した。また、用地取得を順次進めております。
- ⑤ 「鶴川1号踏切道拡幅改良事業」は、完了いたしました。

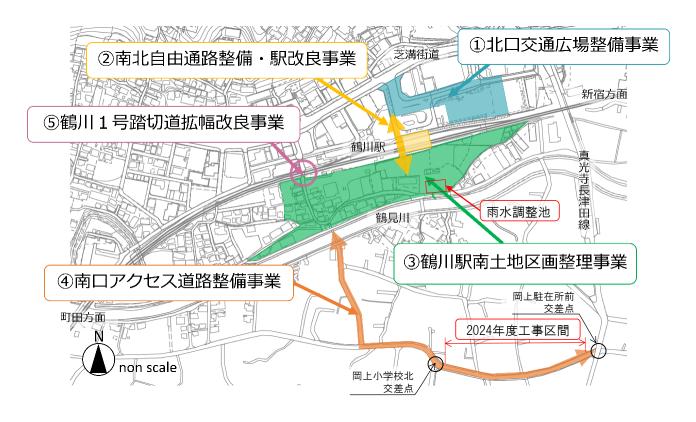

各事業の予定

年 度	2024	2025	2026	2027	
① 北口交通広場整備事業	整備工事(20	I)21年度~2027年 I	F度)	*	使用開始
② 南北自由通路整備·駅改良事業	整備工事(20	I)23年度~2028年 I	F度)	*	使用開始
③ 鶴川駅南土地区画整理事業	建物等移転	整備工事 (2023~	~2030年度)※203	31年度換地処分	
④ 南ロアクセス道路整備事業	用地取得 設計 整備工事(20)23年度~2027年	F度)	*	使用開始
⑤ 鶴川1号踏切道拡幅改良事業	工事				
使用開始 ★現在					

3 鶴川駅南地区の街づくりについて

「鶴川駅南口のまちなみをつくる会」の開催

駅とまちが一体となった良好なまちなみ空間の構築を目指すため、土地区画整理事業区域内の地権者のみなさまと将来のまちなみについて考える機会として、和光大学ポプリホール鶴川において、「鶴川駅南口のまちなみをつくる会」を全5回開催しました。

開催日程

	開催日	テーマ			
第0回	2024年 3月 7日	キックオフミーティング(会の目的・予定等)			
第1回	2024年 5月18日	魅力的なまちなみとは?			
第2回	2024年 7月 6日	みどり豊かなまちとは?			
第3回	2024年 9月19日	歩きたくなるまちとは?			
第4回	2024年10月26日	居心地のよいまちとは?			



横断防止槽

9 フェンス 点字ブロック

| | ジェルター (パスや特合場所 の屋根)







開催状況
