

(仮称) 町田市立国際工芸美術館基本設計の進捗状況について

(仮称) 町田市立国際工芸美術館の基本設計のスケジュールについて報告します。

1 工期の変更について


新型コロナウイルス感染拡大防止対応等の影響により工程に遅れが生じたため、(仮称) 国際工芸美術館基本設計及び国際版画美術館改修基本設計の工期を3ヵ月延長しました。

- ▶ 変更前 2020年9月30日まで
- ▶ 変更後 2020年12月28日まで

2 事業スケジュールの見直しについて

工期の変更に伴い、その後の美術館整備のスケジュール、及び芹ヶ谷公園整備の実施設計以降のスケジュールについて、次のとおり見直しました。

▼見直し後

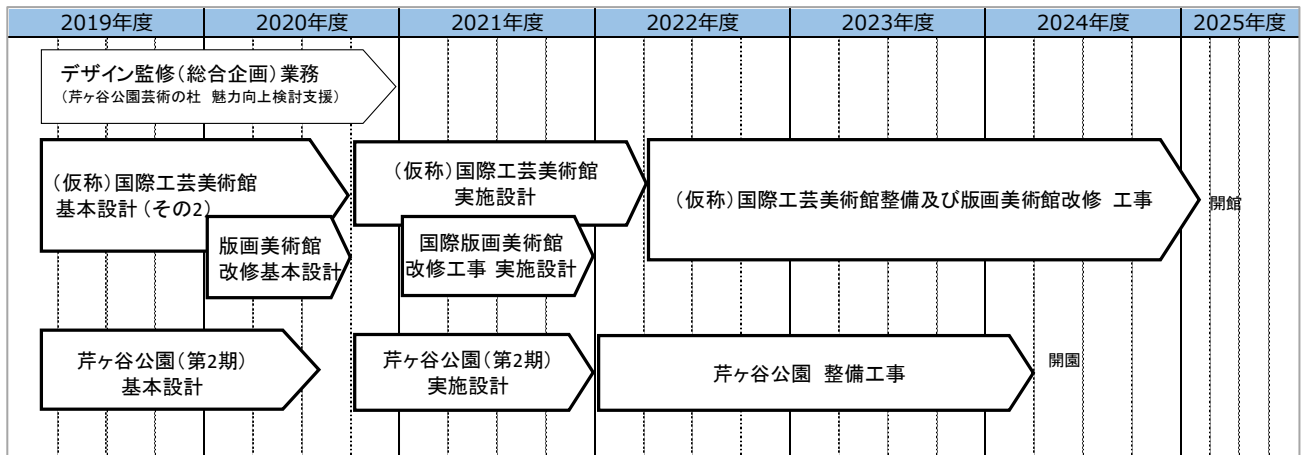

▼見直し前

