

## 新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえ、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき整備を進めている、新たなごみの資源化施設について、2020年9月の行政報告以降の進捗状況等を報告いたします。

### 1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設の整備について、相原地区は2025年度、上小山田地区は2027年度の稼働に向け、関係者と施設の建設に関する協議及び調整を進めています。また、現在、町田リサイクル文化センター内で処理を行っているトレイ、紙パック類、ペットボトル等について、資源ごみ処理施設が稼働するまでの間、暫定処理を行なう準備を進めています。

### 2 町田市バイオエネルギーセンター（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

#### （1）地区連絡会

町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会の委員を対象に、2020年11月23日に、工事現場見学会を実施しました。当日は、多くの委員に参加いただき、煙突の内部、工場見学用の通路等を見学し、工事の進捗状況や新工場の規模を確認していただきました。



<写真：地区連絡会委員見学の様子>


#### （2）工事の進捗状況及び今後の予定

現在、工事は予定通り進んでおり、建築工事では、新工場棟・新管理棟の内外装工事を進めています。プラント工事では、焼却設備、発電設備、バイオガス化設備の設置工事を進めています。

また、2021年1月頃から西側の交差点改良工事に着手する予定です。

工事にあたっては、引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めてまいります。

【町田市バイオエネルギーセンター工事位置図】

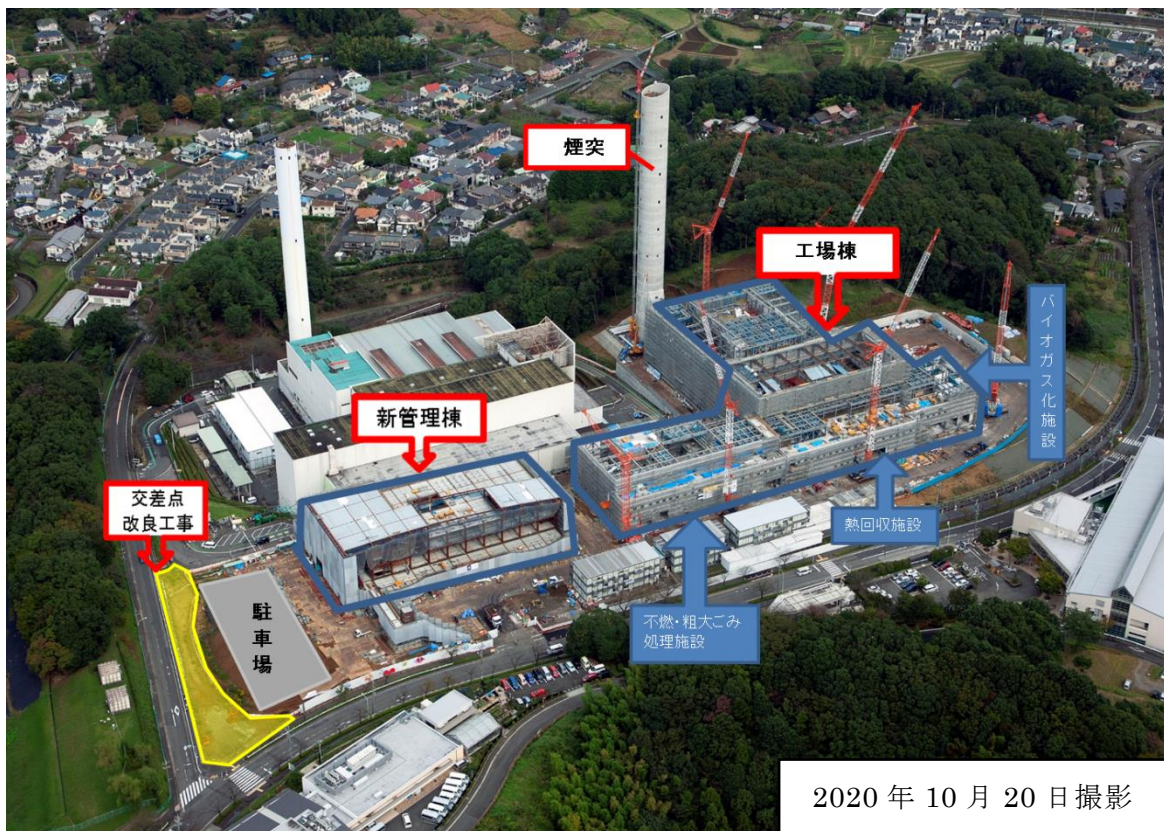

【施設整備のスケジュール】

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					現在 ↓				
設計	[Bar]								
第1期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事 造成工事								
第2期工事			工場棟建築工事・プラント工事 新管理棟建築工事						
第3期工事							2022年1月～ ★ 施設稼働 運営開始		
第4期工事						既存工場棟解体工事			
						ストックヤード棟・外構工事			
