

新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえ、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき整備を進めている、新たなごみの資源化施設について、2020年12月の行政報告以降の進捗状況等を報告いたします。

1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設整備について、相原地区は2025年度、上小山田地区は2027年度の稼働に向け、関係者と施設の建設に関する協議及び調整を進めております。また、現在、町田リサイクル文化センター内で処理を行っているペットボトル、容器包装プラスチックのバール置場については、資源ごみ処理施設が稼働するまでの間、町田リサイクル文化センターに隣接している排水浄化センターにおいて暫定処理を行なう事で準備を進めております。

2 町田市バイオエネルギーセンター（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

（1）地区連絡会

2月15日に開催を予定しておりました第25回町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として書面会議としました。第24回の書面会議にていただいた意見への回答、地区連絡会等の開催スケジュール等の資料を郵送し、御意見をいただく形としました。


（2）工事の進捗状況及び今後の予定

現在、新工場棟・新管理棟の内外装工事、焼却設備、発電設備、バイオガス化設備のプラント工事が順調に進んでいます。今後は、植栽、フェンス設置などの外構工事を進めてまいります。

また、西側の交差点改良工事に着手しました。

工事にあたっては、引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めてまいります。

【町田市バイオエネルギーセンター工事位置図】

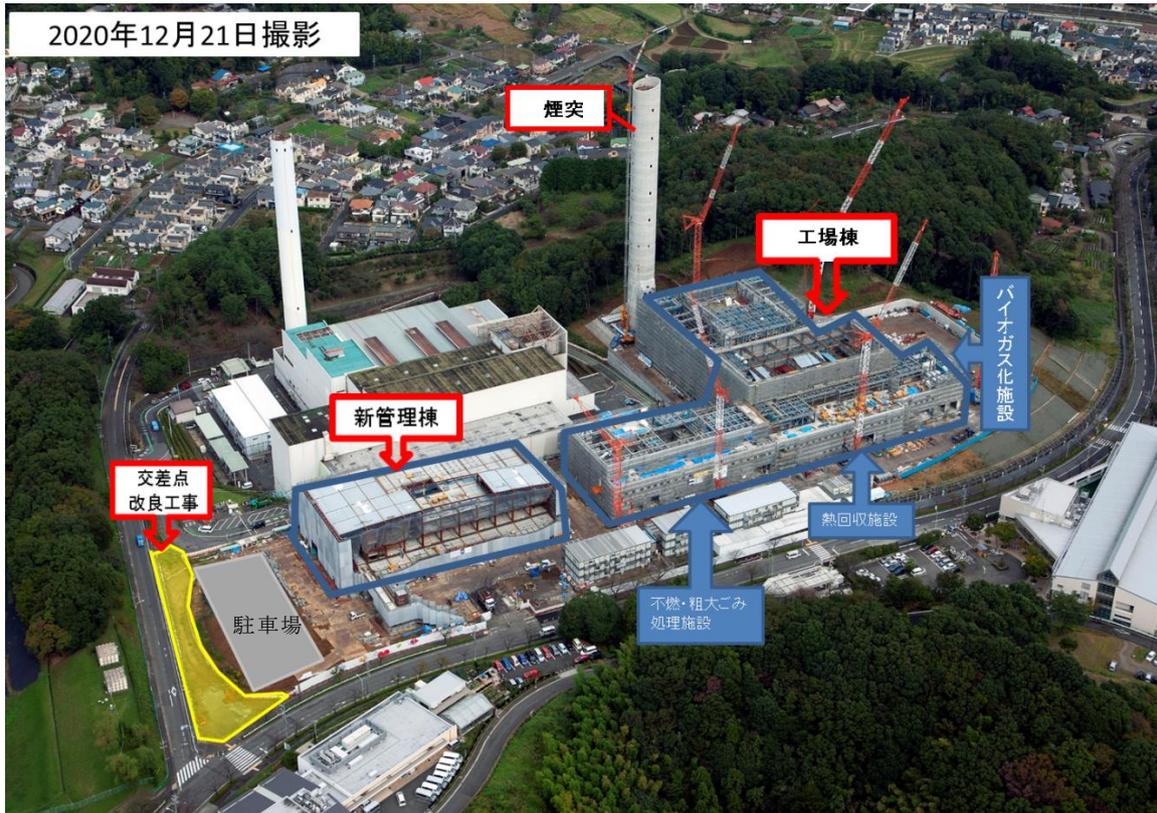

【施設整備のスケジュール】

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					現在 ↓				
設計	[Blue bar]								
第1期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事 造成工事								
第2期工事			工場棟建築工事・プラント工事 新管理棟建築工事						
第3期工事							2022年1月～ 運営開始		
第4期工事							既存工場棟解体工事		
							ストックヤード棟・外構工事		
