

新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえ、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき整備を進めている、新たなごみの資源化施設について、2022年9月の行政報告以降の進捗状況等を報告します。

1 町田市資源循環型施設整備基本計画の見直しについて

2013年度に策定した整備基本計画について、2022年4月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されるなど、資源ごみ処理に関する状況が計画策定時から変化しているため、分散化等の基本方針はそのままに、計画ごみ量を更新するなど、見直しを行っています。

2 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設整備は、相原地区は2025年度、上小山田地区は2027年度の稼働に向け、関係者等と施設の建設に関する協議、調整を進めています。

相原地区につきましては、現在、用地取得に向け、関係者等との調整を進めています。また、施設建設に向け、プラントメーカーから見積設計図書を取得するため、発注仕様の作成を開始しました。

今後も地域のご理解を得ながら、整備事業を進めます。

3 町田市バイオエネルギーセンター（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

（1）工事の進捗状況

旧工場の解体工事は、内部機械の撤去を順次進め、建物の解体工事に着手していきます。煙突の解体工事は、内部設備の撤去が完了し、外壁の解体を進めています。工事にあたっては、引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めます。

【旧焼却施設解体工事写真】



【施設整備の全体スケジュール】


	(年度)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
設計	[Bar]									
第1期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事 造成工事									
第2期工事			工場棟建築工事・プラント工事 新管理棟建築工事				2022年1月～ 施設稼働	2022年1月～ 運営開始		
第3期工事						既存工場棟解体工事				
第4期工事						ストックヤード棟・外構工事				

(2) 旧工場敷地内の土壌汚染調査について

旧リサイクル文化センターの解体工事におきましては、土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、土壌汚染調査を行う必要があります。

9月の行政報告において未調査として報告した76地点（98検体）については、来年1月中旬に土壌採取を完了し、2月中旬に分析結果が得られる予定です。調査結果につきましては改めて報告します。

【調査地点図】

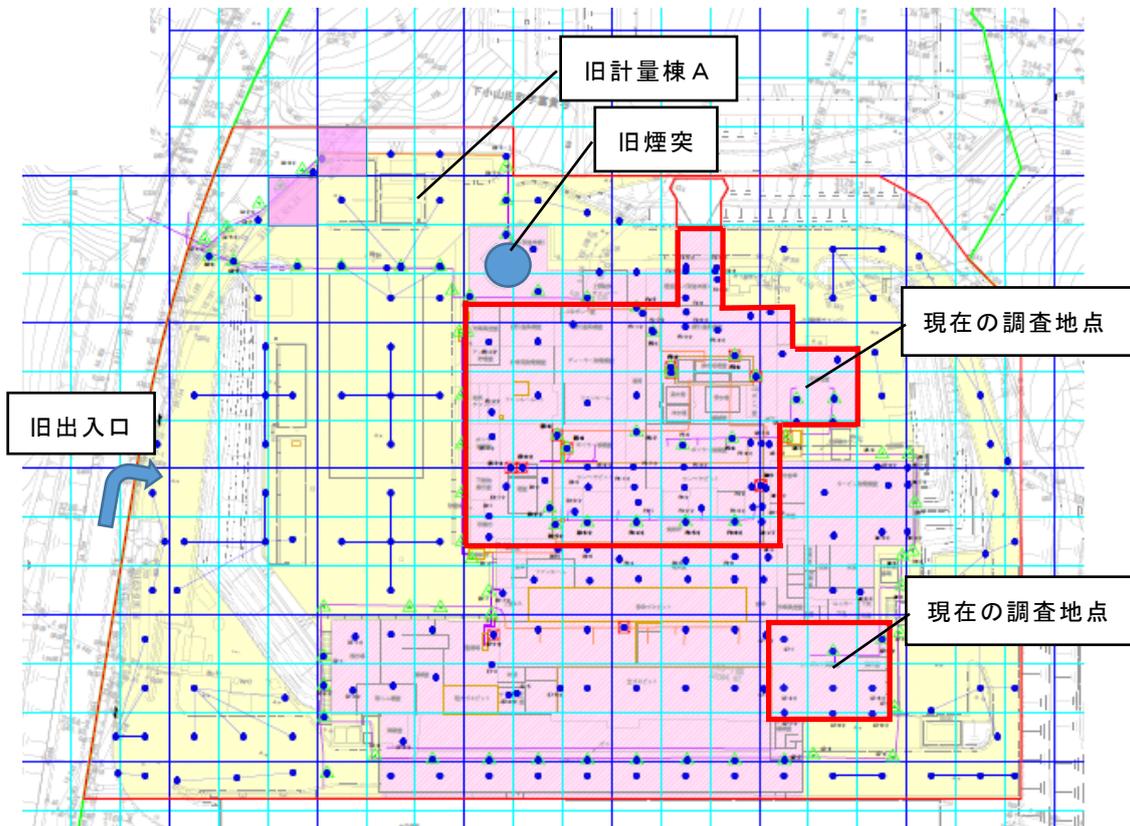

4 町田市バイオエネルギーセンター運営協議会について

町田市バイオエネルギーセンターでは、施設運営状況を近隣 15 町内会の代表者の方に報告及び協議いただく場として、運営協議会を設置しています。10月に第3回運営協議会を開催しました。

①開催日時・場所

2022年10月26日（水）14：00～

町田市バイオエネルギーセンター第3・4・5会議室

②主な議事と委員からのご意見等

(ア) 運転状況報告（ごみ処理実績、排ガスの測定結果など）

ガス発電機の排ガス測定値について

(イ) 火災の対応状況（火災後の補修について）

対応状況の確認

(ウ) 緊急対応マニュアル、苦情対応マニュアルについて

周辺施設への連絡の確保

(エ) その他（愛称募集の経過報告と今後の予定、土壌汚染調査について）

③運転状況（参考）

