

## 鶴川東地区統合新設小学校の建替え時期の変更について

新たな学校づくり推進計画に基づき、学校統合を予定している鶴川東地区統合新設小学校(以下、「鶴川東小」という。)は、現在の鶴川二小の位置に新校舎を建設します。

当初のスケジュールでは、2025年度に校庭に仮校舎を建設し、2026年度から新校舎建設工事を始め、2029年度から新校舎の使用開始を予定していました。

新校舎の建設にあたり、敷地北側斜面の土砂災害特別警戒区域の指定解除に向けて、2017年度に他校で実績のある工法で工事を予定していましたが、新たに擁壁改修等の工事が必要になることが2024年1月に判明しました。

そのため、敷地の安全対策の実施と併せて教育環境への影響を最小限に抑えるために、鶴川東小の建替え時期を変更し、新校舎の使用開始時期を2033年度に変更します。

### 1 建替え時期を変更する理由

#### (1)設計・工事等の期間延長

土砂災害特別警戒区域の指定解除のために敷地北側の擁壁改修と斜面の傾斜角度を改善する工事を行うため、地盤調査、設計、工事にかかる期間が新たに必要となりました。

#### (2)工事期間中の教育環境の確保

敷地北側の擁壁改修等に伴い、新校舎の位置を校庭側(敷地南側)に寄せる必要があり、工事中の校庭面積が非常に狭く教育活動への影響が大きいため、校庭に仮校舎を建設して建替えを行うことは難しいと判断しました。そのため2028年度末に使用が終わる鶴川三小の校舎を2029年度から仮校舎として使用します。

※【資料1】鶴川二小における建設工事中の想定配置図

### 2 鶴川東西地区のスケジュール等の変更

建替え時期の変更に伴い鶴川東西地区のスケジュール等の変更を行います。

※【資料2】鶴川東西地区の統合及び工事等スケジュール変更

#### (1)鶴川東地区の設計・工事等に関する変更

①敷地内に予定していた仮校舎建設を取りやめます。

②擁壁改修等の設計のため、基本・実施設計期間を2年から3年に延長します。

③校舎建替え工事の着手(既存校舎解体)を2026年度から2029年度に変更します。

④鶴川二小既存校舎の解体後に擁壁改修工事を行うため、既存校舎解体から新校舎完成までの工事期間を3年から4年に延長し、新校舎使用開始を2033年度とします。

## (2) 鶴川東西地区の変更内容一覧



	項目	変更前	変更後
鶴川東地区	① 基本・実施設計時期	2023年度から2024年度(2年)	・2023年度から2025年度(3年) ・擁壁改修等の設計を2024年度から2025年度に実施
	② 新校舎建設工事時期	2026年度から2028年度(3年)	2029年度から2032年度(4年)
	③ 統合年度	2026年度	2029年度
	④ 統合する学区	鶴川二小と鶴川三小の一部	鶴川二小と鶴川西地区統合新設小の一部(現鶴川三小の一部)
	⑤ 仮校舎の位置	鶴川二小(仮設校舎)	鶴川三小(既存校舎)
	⑥ 新校舎の位置	鶴川二小(鶴川東小)	変更なし
	⑦ 新校舎使用開始年度	2029年度	2033年度
鶴川西地区	① 基本・実施設計時期	2024年度から2025年度(2年)	変更なし
	② 新校舎建設時期	2026年度から2028年度(3年)	変更なし
	③ 統合年度	2026年度	変更なし
	④ 統合する学区	鶴川四小と鶴川三小の一部	・鶴川四小と鶴川三小 ・2029年度に学区の一部を鶴川東小に変更
	⑤ 仮校舎の位置	鶴川三小(既存校舎)	変更なし
	⑥ 新校舎の位置	鶴川四小(鶴川中央小)	変更なし
	⑦ 新校舎使用開始年度	2029年度	変更なし

## 3 保護者や地域、市民への周知状況

計画の変更について、下表のスケジュールで周知に努めております。

時期	内容
2月13日	鶴川三小新入生、在校生保護者説明会 鶴川二小新入生、在校生保護者説明会 町田市ホームページ 掲載
2月19日	鶴川西地区新たな学校づくり推進協議会
2月21日	鶴川東地区新たな学校づくり推進協議会
2月～3月	鶴川二小保護者会 鶴川三小保護者会 鶴川四小保護者会
3月上旬	鶴川地区新たな学校づくり通信 配布
3月8日	教育委員会第12回定例会 報告
3月14、15日	町田市議会第1回定例会 行政報告
3月20日	「まちだの教育」発行
2月中旬以降適宜	鶴川東西地区町内会・自治会説明 学童保育クラブ、まちとも運営協議会説明

【資料1】鶴川二小における建設工事中の想定配置図

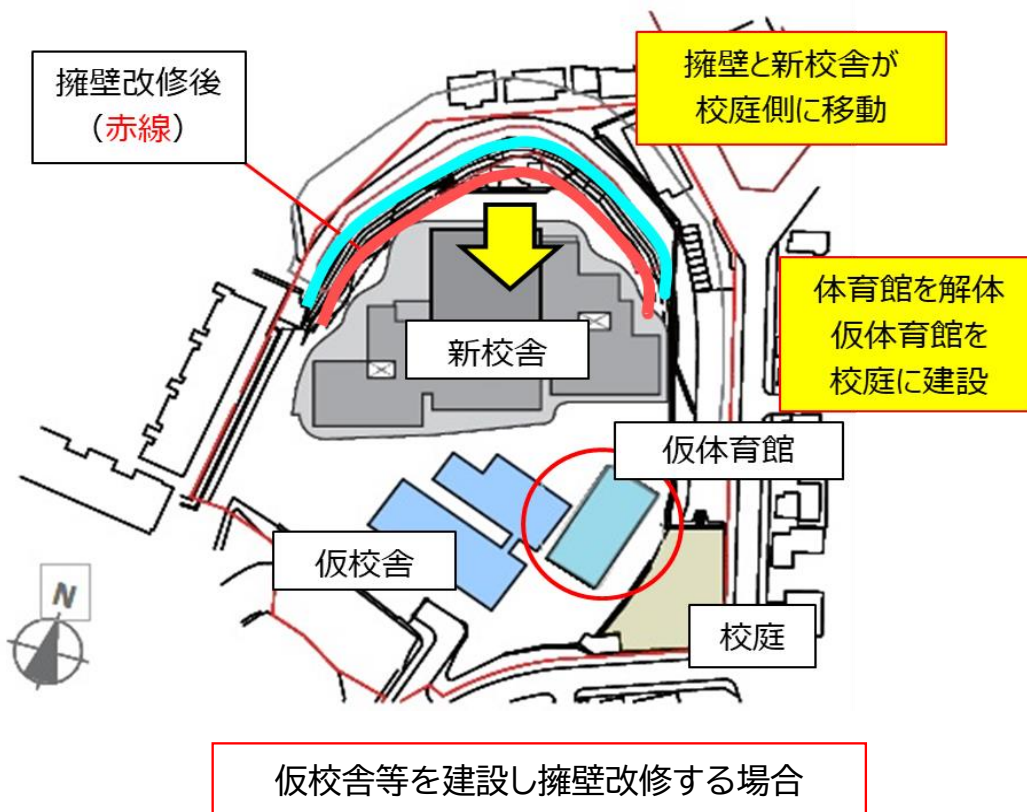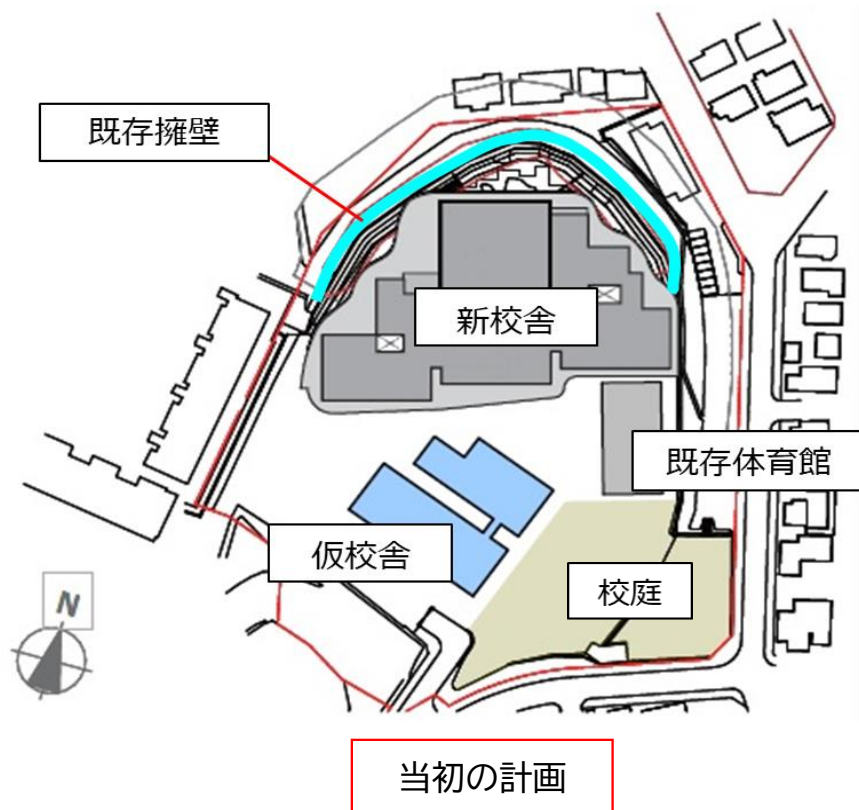

- 北側斜面の擁壁改修が新たに必要ことが判明し、工事期間が3年から4年に延びる。
- 工事中の校庭面積が1 / 3程度に狭くなる。



教育活動や児童の学校生活に影響が大きいため、鶴川二小の敷地に仮校舎を建設して建替えを進めることは困難と判断。

【資料2】鶴川東西地区の統合及び工事等スケジュール変更

【凡例】

	: 設計等に関する期間
	: 仮校舎に関する期間
	: 工事に関する期間
	: 新校舎使用期間

■表1 統合及び全体スケジュール（変更前）

対象校	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 鶴二小 鶴川東地区 鶴川東小	A 既存校舎使用 ①基本・実施設計			B 校舎建替え工事 ②校舎解体 ③新校舎建設			C 新校舎使用 2029～ 校庭整地等				
				仮校舎建設 鶴川東小仮校舎として使用 D 鶴二小と鶴三小(一部)を統合			仮校舎解体				
2 鶴三小	既存校舎使用			鶴川中央小仮校舎として使用 E 鶴三小(一部)と鶴四小を統合							
				教室転用工事							
3 鶴四小 鶴川西地区 鶴川中央小	既存校舎使用			校舎建替え工事			新校舎使用 2029～				
	基本・実施設計			校舎解体 新校舎建設			校庭整地等				
鶴川東地区	工事 ■2025年度：自校校庭に仮校舎建設 ■2026年度から2028年度(3年間)：校舎建替え工事 ■2029年度：新校舎使用開始										
	統合 ■2026年度：自校仮校舎で鶴二小と鶴三小の一部を統合										
鶴川西地区	工事 ■2025年度：鶴三小校舎を仮校舎として使用するため教室転用工事 ■2026年度から2028年度(3年間)：校舎建替え工事 ■2029年度：新校舎使用開始										
	統合 ■2026年度：鶴三小校舎(仮校舎)で鶴三小学区の一部と鶴四小を統合										

■表2 統合及び全体スケジュール（変更後）

対象校	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 鶴二小 鶴川東地区 鶴川東小	A 既存校舎使用			B 校舎建替え工事			C 新校舎使用				
	①基本・実施設計			③校舎解体 ④擁壁設置 ⑤新校舎建設			校庭整地等				
2 鶴三小	既存校舎使用			鶴川中央小仮校舎として使用 D 鶴三小(全部)と鶴四小を統合			鶴川東小仮校舎として使用 E 鶴二小と鶴三小学区(一部)を統合				
				教室転用工事							
3 鶴四小 鶴川西地区 鶴川中央小	既存校舎使用			校舎建替え工事			新校舎使用 2029～				
	基本・実施設計			校舎解体 新校舎建設			校庭整地等				
鶴川東地区	工事 ■2029年度から2032年度(4年間)：校舎建替え工事 ■2033年度：新校舎使用開始										
	統合 ■2029年度：鶴三小校舎(仮校舎)で鶴二小と鶴三小学区の一部を統合										
鶴川西地区	工事 ■2025年度：鶴三小校舎を仮校舎として使用するため教室転用工事 ■2026年度から2028年度(3年間)：校舎建替え工事 ■2029年度：新校舎使用開始										
	統合 ■2026年度：鶴三小校舎(仮校舎)で鶴三小(全部)と鶴四小を統合										
