


鶴川駅周辺再整備事業の進捗状況について

1 趣旨・背景


2016年に策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」の実現を図るため、北口交通広場整備事業、南北自由通路整備事業、鶴川駅改良事業、鶴川駅南土地区画整理事業及び南口アクセス道路整備事業等を進めており、各事業の進捗状況について報告します。

2 各事業の進捗状況について

- ①「北口交通広場整備事業」は、一般車乗降場や4番及び5番バス停のバスシェルターが完成しております。2026年度は3番バス停のバスシェルター工事に着手いたします。
- ②「南北自由通路整備事業」は、基礎工事や橋梁架設等を進めております。2026年度も引き続き橋梁架設を進めるとともに、昇降設備工事に着手いたします。
- ③「鶴川駅改良事業」は、駅舎の鉄骨工事等を進めております。2026年度も引き続き鉄骨工事等を進めるとともに、外装工事に着手いたします。
- ④「鶴川駅南土地区画整理事業」は、2025年度に予定していた建物等の移転が完了するとともに、雨水調整池工事を進めました。2026年度は、引き続き雨水調整池工事を進めるとともに、道路工事や宅地造成工事に着手いたします。
- ⑤「南口アクセス道路整備事業」は、用地取得が完了いたしました。2026年度は、橋梁工事や道路拡幅工事に着手いたします。

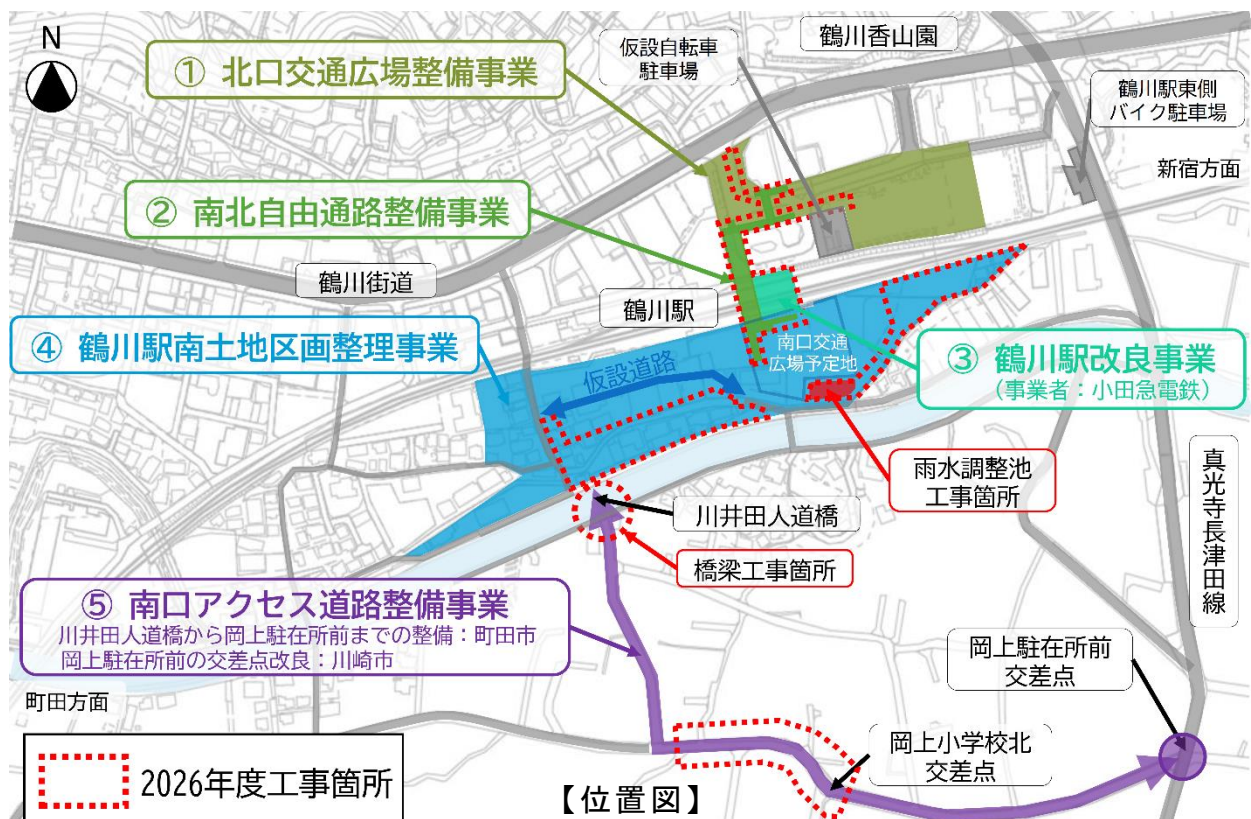

(参考) 現場の様子

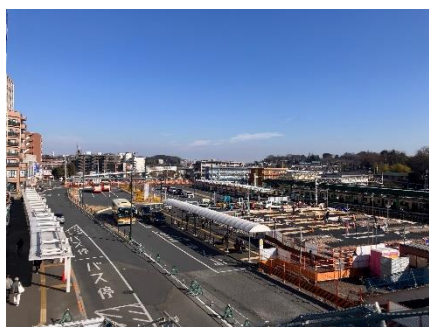

北口交通広場の状況



自由通路の架設工事



駅舎の鉄骨工事



仮設道路
(区画整理事業)



雨水調整池工事
(区画整理事業)




用地取得状況
(アクセス道路整備事業)

3 鶴川駅北側の自転車・バイク駐車場について

鶴川駅北側において、小田急電鉄株式会社が運営する自転車・バイク駐車場（オダクル鶴川第2及びオダクル鶴川東口）が2月28日に閉鎖しました。小田急電鉄は、オダクル鶴川第2跡地に立体駐輪・駐車場の建設を計画しており、2月28日から、3番バス停付近にて仮設の自転車駐車場（一時利用）を運営しております。

このため、バイク駐車場がなくなることから、町田市では「鶴川駅東側バイク駐車場」について、運営する（公財）自転車駐車場整備センターと協議し、2027年3月までの間、バイク定期利用の申込みを受付けることとしました。また、自転車駐車場（定期利用）がなくなるため、民間事業者と連携し、「鶴川駅周辺自転車・バイク駐車場（定期利用）案内図」の作成、周知を行いました。

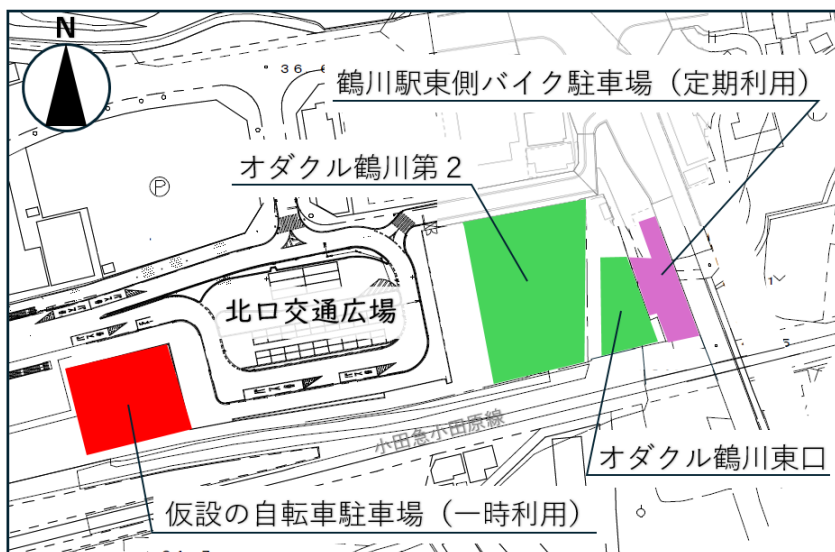



【鶴川駅周辺自転車・バイク駐車場（定期利用）案内図】

4 整備スケジュールについて

現在

年度	2025	2026	2027	2028	2029
① 北口交通広場整備事業	整備工事（2021年度～2027年度）			★使用開始	
② 南北自由通路整備事業	整備工事（2023年度～2027年度）			★使用開始	
③ 鶴川駅改良事業 (事業者：小田急電鉄)	整備工事（2023年度～2027年度）			★使用開始	
				既存駅舎解体等	
④ 鶴川駅南土地区画整理事業	建物等移転・整備工事（2023年度～2030年度）				
				★南口交通広場 仮使用開始	★南口交通広場 使用開始
⑤ 南口アクセス道路整備事業	用地取得				
	整備工事（2023年度～2028年度）			★使用開始	

【各事業の工程表】

