


鶴川駅周辺再整備事業の進捗状況について

1 主旨・背景

2016年に策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」の実現を図るため、北口交通広場整備事業、南北自由通路整備事業、鶴川駅改良事業、鶴川駅南土地区画整理事業及び南口アクセス道路整備事業等を進めており、各事業の進捗状況について報告します。

2 各事業の進捗状況について


- ①「北口交通広場整備事業」は、3番バス停のバスシェルター工事や歩道整備等を進めています。
- ②「南北自由通路整備事業」は、基礎工事や橋桁架設等を進めています。引き続き橋桁架設を進めるとともに、昇降設備工事、内外装仕上工事に着手します。
- ③「鶴川駅改良事業」は、駅舎の鉄骨工事等を進めています。
- ④「鶴川駅南土地区画整理事業」は、雨水調整池工事を進めています。引き続き雨水調整池工事を進めるとともに、道路工事及び宅地造成工事に着手します。
- ⑤「南口アクセス道路整備事業」は、道路改良工事を進めています。

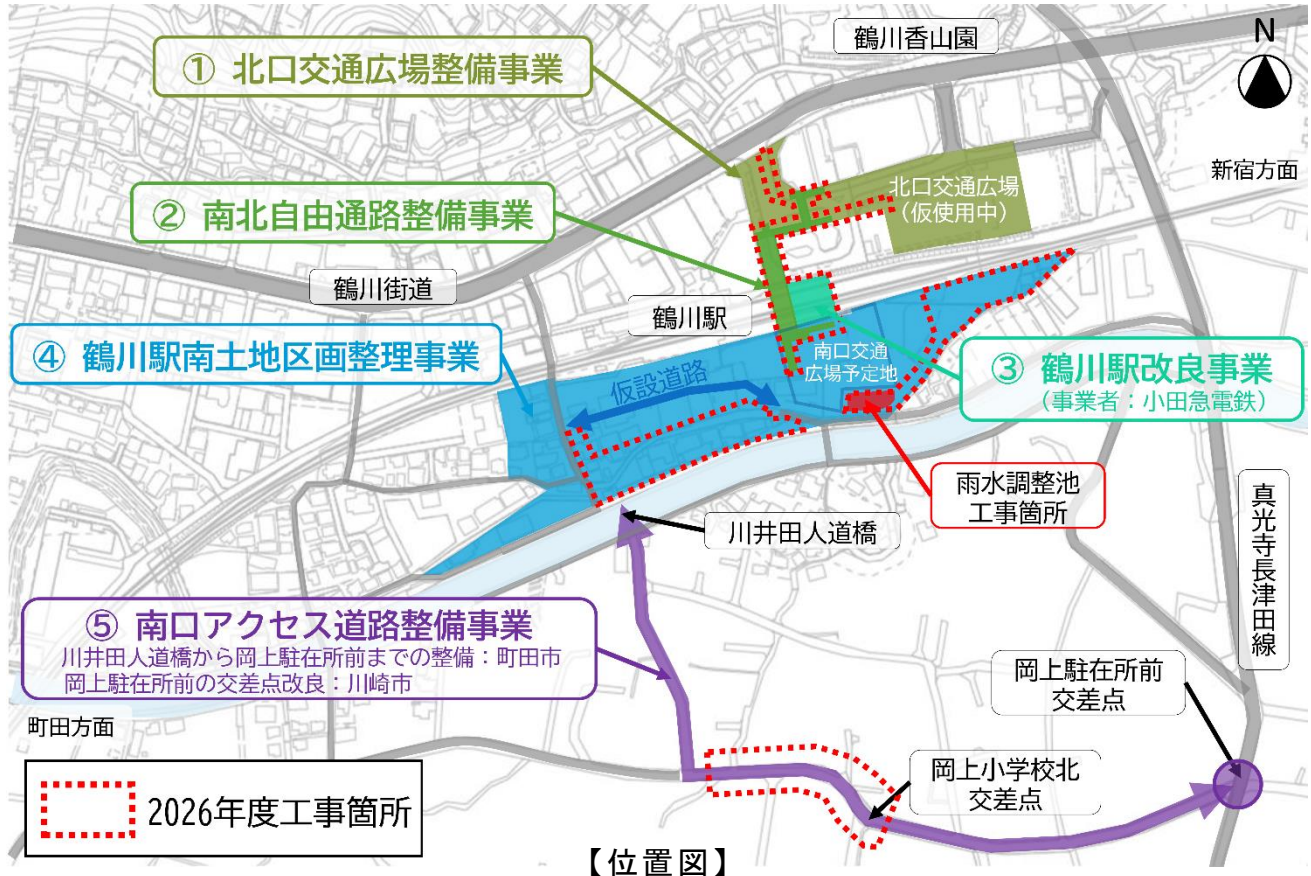

(参考) 現場の様子



北口交通広場・駅改良の状況

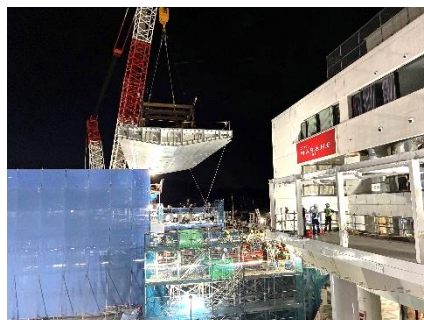

自由通路橋桁架設工事



自由通路の全景



区画整理事業の状況



区画整理事業の仮設道路



南口アクセス道路工事

3 整備スケジュールについて

⑤「南口アクセス道路整備事業」は、鶴見川に架け替える橋梁工事の工程見直し等により、使用開始予定を2030年3月に変更しました。

南口交通広場は、2027年度末の南北自由通路及び駅舎の使用開始に合わせて、予定どおり仮使用を開始します（歩行者のみ通行可能）。

なお、南口交通広場の使用開始は、南口アクセス道路の使用開始に合わせて、2030年3月に変更しました。

年 度	2026	2027	2028	2029	2030
① 北口交通広場整備事業	整備工事 (2021年度～2027年度)		★使用開始		
② 南北自由通路整備事業	整備工事 (2023年度～2027年度)		★使用開始		
③ 鶴川駅改良事業 (事業者：小田急電鉄)	整備工事 (2023年度～2027年度)		★使用開始		
			既存駅舎解体等		
④ 鶴川駅南土地区画整理事業	建物等移転・整備工事 (2023年度～2030年度)				
		★南口交通広場 仮使用開始		★南口交通広場 使用開始	
⑤ 南口アクセス道路整備事業	整備工事 (2023年度～2029年度)			変更箇所	★使用開始

現在

