


東京都における境川の治水対策について

東京都は、2012年11月策定の「中小河川における都の整備方針～今後の治水対策～」に基づき、境川の治水対策として新たに調節池の整備を進めています。建設候補地のうち、境川クリーンセンターの跡地に検討していた調節池の進捗状況を報告します。

【境川木曾東調節池事業概要】

- ・境川クリーンセンターの再整備に伴うゾーン計画で設定した広場ゾーンの地下に、東京都が調節池を整備します。

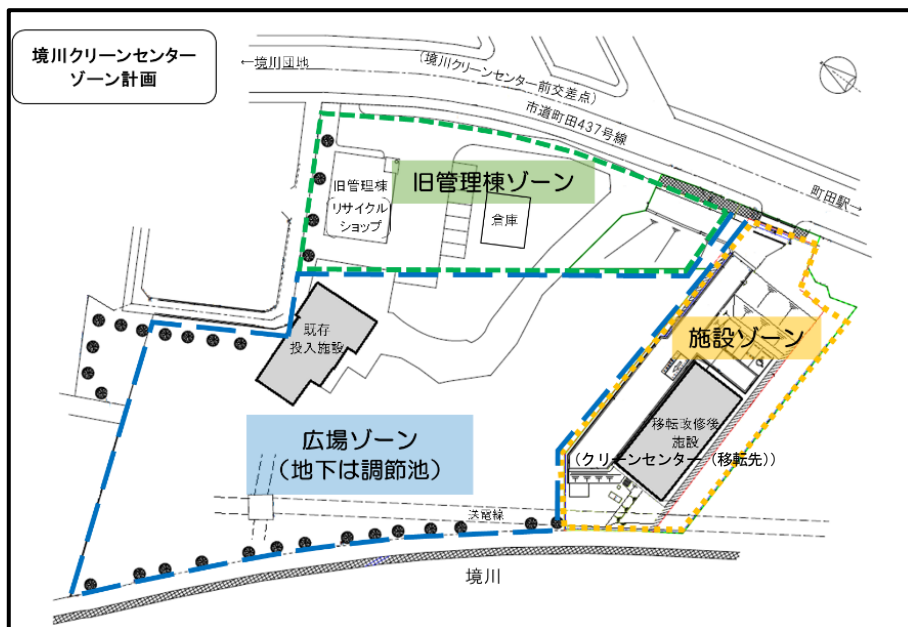


木曾東調節池完成イメージ図1 (東京都建設局提供)

【鳥瞰図イメージ】(下流より)



木曾東調節池完成イメージ図 2（東京都建設局提供）

調節池整備箇所

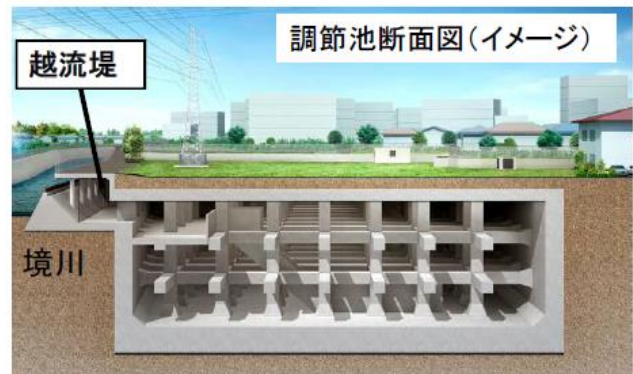

名称	境川木曾東調節池
設置場所	町田市木曾東二丁目195番地8外
貯留量	約4万9千m ³
形式	地下式
施工規模	延長約115m、幅約60m、深さ約2.2m
管理棟	地上2階
その他	東京都が2017年7月26日に事業説明会を実施

- ・河川管理者である東京都が調節池を整備し、付属施設（ポンプ設備や換気設備）を含め管理を行います。
- ・調節池は地下式の構造となるため、上部の利用方法については町田市で検討を進めます。

【今後の予定】

- ・2017年10月 境川木曾東調節池に関する基本協定締結（町田市・東京都）
- ・2017年度中 調節池準備工事着手（支障物撤去等）
- ・2018年度 調節池本体工事着手（2025年度完了）
